



2EF6425F29

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/00059/15/01-001 Item: 001
PI: 2008/00727
ESCOLA: 17113 - EE CID DE HIROSHIMA
LOCAL: RUA RUA VENANCIO LISBOA, 382 - CEP: 08280-590 - JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 820.456,27 ✓

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 820.414,31 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220151125253	2603541099	Eng. Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção		ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 14,14			
PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 243 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 17-09-2015	DATA DE TÉRMINO: 14-05-2016 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 07-02-2017	ATRASOS JUSTIFICADOS: 266 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 16

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR.

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados de páginas 01 a 03.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 26 de julho de 2017

RESPONSÁVEIS

Engº Antonio Correra Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

Eng.º Vitorino
Coordenador de
Metropolitas
CREA 92.262/D

Critério		Unitária e Global		Contrato	72/00059/15/01-001-001	Valor	820.456,27	Construtora		BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	
Data base		01/2015		Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município		SÃO PAULO	
Dt. Prevista		09/01/2017		Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria		LESTE 4	
Dt. Realização		22/02/2017		Término	14/05/2016	Redução	34.0200%	Nome Interv.		EE CID DE HIROSHIMA	
Nro. Medição		16		Prédio	17113	Orc. FDE	1.243.584,71	Fiscal		CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII	
PI		2008/00727		Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.		6376.02	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período			
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste		
02.02.063	ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇÃO EM SOLO	M	78,00 269,00	78,00 78,00	0,00	20.982,00 20.982,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	54,05 50,00	62,43 62,43	0,00	3.121,50 3.121,50	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.02.093	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ	UN	1,00 13.000,00	1,00 1,00	0,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	52,04 45,00	30,45 30,45	0,00	1.370,25 1.370,25	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	556,00 6,80	556,00 556,00	0,00	3.780,80 3.780,80	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	3,00 6,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	6,97 400,00	6,19 6,19	0,00	2.476,00 2.476,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	1,30 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	4,20 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
03.03.000	CONCRETO	%	4.302,00 0,00	100,00 100,00	0,00	4.302,00 4.302,00	54,60 54,60	0,00	0,00		
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	59.048,00 0,00	100,00 100,00	0,00	59.048,00 59.048,00	3.747,27 3.747,27	0,00	0,00		
04.01.000	ALVENARIA	%	5.666,77 0,00	100,00 100,00	0,00	5.666,77 5.666,77	359,61 359,61	0,00	0,00		
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	2.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.000,00 2.000,00	126,92 126,92	0,00	0,00		
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	3.600,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.600,00 3.600,00	228,45 228,45	0,00	0,00		
06.02.000	PORTAS	%	2.188,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.188,00 2.188,00	138,84 138,84	0,00	0,00		

Eng.º
Maurício C. de Barros
Coordenador de Obras
CREA 9.2.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00059/15/01-001-001	Valor	820.456,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	34,0200%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	1.243.584,71	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376.02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	43.929,00	100,00	0,00	43.929,00	836,34	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	1.028,70	100,00	0,00	1.028,70	65,27	0,00	0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	5.600,00	100,00	74,00	5.600,00	355,37	4.144,00	262,98
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	432,00	100,00	0,00	432,00	27,41	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	47.380,00	100,00	0,00	47.380,00	3.006,80	0,00	0,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	19.750,00	100,00	0,00	19.750,00	1.253,33	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	1.800,00	100,00	0,00	1.800,00	114,22	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS	%	615,20	100,00	0,00	615,20	39,03	0,00	0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	2.714,00	100,00	0,00	2.714,00	172,22	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVIÇOS	%	45.350,00	100,00	0,00	45.350,00	2.877,96	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO	%	6.750,00	100,00	0,00	6.750,00	428,34	0,00	0,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	90.453,00	100,00	0,00	90.453,00	5.740,27	0,00	0,00
09.04.000	QUADRO GERAL	%	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	95,17	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	40.584,70	100,00	0,00	40.584,70	1.287,75	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	980,00	100,00	0,00	980,00	62,17	0,00	0,00
			0,00	100,00		980,00	62,17		

Eng. Antônio de Aguiar
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00059/15/01-001-001	Valor	820.456,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	34.0200%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	1.243.584,71	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376.02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIACAO	%	8.718,50	100,00	0,00	8.718,50	276,63	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	6.820,00	100,00	0,00	6.820,00	276,63	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	3.260,00	100,00	0,00	3.260,00	216,40	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	1.320,00	100,00	0,00	1.320,00	216,40	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	76.319,60	100,00	0,00	76.319,60	206,87	0,00	0,00
10.01.000	FORRO	%	786,00	100,00	0,00	786,00	206,87	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	1.048,00	100,00	0,00	1.048,00	41,87	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATAÇÃO	%	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00	2.179,50	0,00	0,00
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	1.784,85	100,00	0,00	1.784,85	2.179,50	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	14.036,29	100,00	0,00	14.036,29	49,88	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	293,76	100,00	0,00	293,76	66,50	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	648,70	100,00	0,00	648,70	114,23	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	184,00	100,00	0,00	184,00	18,64	0,00	0,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	325,00	100,00	0,00	325,00	41,16	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	132,30	100,00	0,00	132,30	11,67	0,00	0,00
			0,00	100,00	0,00	132,30	11,67	0,00	0,00
			0,00	100,00	0,00	132,30	20,62	0,00	0,00
			0,00	100,00	0,00	132,30	20,62	0,00	0,00
			0,00	100,00	0,00	132,30	8,39	0,00	0,00
			0,00	100,00	0,00	132,30	8,39	0,00	0,00

Eng.º Antônio Carlos de Freitas
Coordenador de Obras
Metropolitano
CREA 92.262/10

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00059/15/01-001-001	Valor	820.456,27	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	34.0200%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	1.243.584,71	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376.02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.01.000	ESTRUTURA	%	1.313,00	100,00	0,00	1.313,00	83,32	0,00	0,00
			0,00	100,00		1.313,00	83,32		
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	2.307,09	100,00	0,00	2.307,09	146,41	0,00	0,00
			0,00	100,00		2.307,09	146,41		
15.03.000	ESQUADRIAS	%	728,66	100,00	0,00	728,66	46,24	0,00	0,00
			0,00	100,00		728,66	46,24		
15.04.000	EXTERNA	%	9.651,30	100,00	0,00	9.651,30	612,47	0,00	0,00
			0,00	100,00		9.651,30	612,47		
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	0,00	2,10	2,10	1.089,62	69,14	1.089,62	69,14
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.01.064	PT-29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00	5,52	0,00	2.427,30	154,04	0,00	0,00
			0,00	5,52		2.427,30	154,04		
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	9,00	31,50	0,00	4.725,00	299,85	0,00	0,00
			150,00	31,50		4.725,00	299,85		
16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	M2	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
16.02.068	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	160,60	165,90	0,00	6.636,00	421,13	0,00	0,00
			40,00	165,90		6.636,00	421,13		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	199,48	130,14	0,00	650,70	0,00	0,00	0,00
			5,00	130,14		650,70	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3.5CM INCL ARG REG	M2	47,80	139,12	0,00	5.564,80	22,79	0,00	0,00
			40,00	139,12		5.564,80	22,79		
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,00	0,00		0,00	0,00		
16.05.037	CANALETE DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00	22,50	0,00	916,20	58,14	0,00	0,00
			0,00	22,50		916,20	58,14		
16.05.043	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	0,00	5,60	5,60	1.234,07	78,31	1.234,07	78,31
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00		0,00	0,00		

Engº Antônio Carlos de O. Vas
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Crítério	Unitária e Global	Contrato	72/00059/15/01-001-001	Valor	820.456,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	34.0200%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	1.243.584,71	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		6376.02	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	8,36	177,40	177,40	1.774,00	112,58	1.774,00	112,58
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	102,20	42,10	0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	213,80	169,11	0,00	7.609,95	0,00	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	3.809,00	3.828,71	0,00	24.886,61	8,13	0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCCADO FCK=25 MPA	M3	35,70	35,70	0,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCCADO E ADENSADO	M3	24,10	25,46	0,00	8.274,50	30,52	0,00	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUCTURAL DE 19X19X39CM	M2	338,50	360,86	0,00	27.064,50	78,05	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00			

Engº Arlindo de A. Obras
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00059/15/01-001-001	Valor	820.456,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	34.0200%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	1.243.584,71	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376.02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
16.18.071	SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	0,00 0,00	92,00 0,00	92,00	3.358,92 0,00	213,16 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	40,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	UN	2,00 250,00	1,00 0,00	1,00	250,00 0,00	15,86 0,00
16.20.022	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSÍB)	UN	1,00 105.000,00	1,00 1,00	0,00	105.000,00 105.000,00	6.663,45 6.663,45
16.20.042	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL	UN	12,00 600,00	14,00 14,00	0,00	8.400,00 8.400,00	533,07 533,07
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	18,13 18,13	0,00	2.434,85 2.434,85	0,00 0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	30,56 30,56	0,00	1.013,06 1.013,06	64,29 64,29
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	703,62 703,62	44,65 44,65
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT. TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	30,56 30,56	0,00	822,06 822,06	52,16 52,16
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.465,04 1.465,04	92,96 92,96

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
806.376,61	820.414,31	14.037,70
TOTAL SEM REAJUSTE		
TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE
806.376,61	820.414,31	14.037,70
REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
33.595,57	34.461,83	866,26
TOTAL	TOTAL	VALOR A LIBERAR
839.972,18	854.876,14	14.908,96

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII	Walter Haide	CREA 0600748617
--	--------------	-----------------

Eng.º Antônio Roberto Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 72/00059/15/01 - PI: 2008/00727 - CÓD. OBRA: 134608- EE CID DE HIROSHIMA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
03.03.005	M2	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-300KGF/M2	47,80
03.04.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	5.368,00
03.04.005	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	5.368,00
04.01.030	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	12,19
04.01.031	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	94,61
05.01.067	UN	PM-79 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET.	2,00
06.01.024	UN	EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM	2,00
06.01.040	UN	EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)	4,00
06.02.019	UN	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	1,00
06.02.094	M	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	8,60
06.03.001	UN	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	2,00
06.03.019	M	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	6,00
06.03.020	M	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	8,00
06.03.100	M	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	134,30
06.03.101	M	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	3,30
06.03.102	M	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	47,40
07.03.098	M2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM	7,62
08.02.001	UN	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	1,00
08.02.005	UN	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	1,00
08.02.016	M	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	10,00
08.02.041	M	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	10,00
08.03.017	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	24,00
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	392,00
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	4,00
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	182,00
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1,00
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	2,00
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	1,00
08.08.028	UN	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	12,00
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	2,00
08.08.045	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	3,00
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	3,00
08.08.047	UN	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	2,00
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	8,00
08.08.061	UN	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	1,00
08.08.078	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA)	1,00
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	15,00
08.12.015	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M	4,40
08.12.033	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	14,04
08.12.066	UN	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	2,00
08.13.003	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	1,00
08.13.004	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	2,00
08.13.005	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	3,00
08.13.012	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	10,00
08.13.013	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	4,50
08.13.014	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	20,00
08.14.027	UN	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	2,00
08.14.037	UN	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	2,00
08.14.046	UN	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	1,00
08.14.078	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	2,00
08.14.085	M	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	9,00
08.14.086	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	1,00
08.14.087	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	1,00
09.02.049	UN	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS	1,00
09.02.061	UN	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	1,00
09.02.088	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1,00
09.03.009	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	66,00
09.03.011	M	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	891,00
09.03.012	M	CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	264,00
09.03.052	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	198,00
09.03.090	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	99,00
09.04.022	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A	1,00
09.05.002	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	1.539,00
09.05.005	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	19,00

Eng. Antonio Correia Neto
Coordenador de Obras
Metropolitano
CREA 92.262/0

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 72/00059/15/01 - PI: 2008/00727 - CÓD. OBRA: 134608- EE CID DE HIROSHIMA

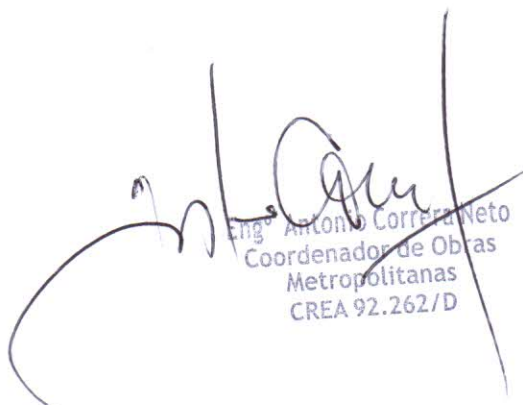
CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
09.05.008	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES	66,00
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	159,00
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	96,00
09.05.015	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	43,00
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	100,00
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	1,00
09.05.045	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	1,00
09.05.051	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	1,00
09.05.069	UN	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	1,00
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	6,00
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	20,00
09.05.074	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1,00
09.05.075	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	1,00
09.05.076	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	1,00
09.05.088	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	1,00
09.05.092	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	2,00
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1,00
09.06.002	UN	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"	1,00
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	12,00
09.07.004	M	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	1.995,00
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	480,00
09.07.011	M	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	172,00
09.07.012	M	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	95,00
09.08.055	UN	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	12,00
09.08.058	UN	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	2,00
09.08.075	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	1,00
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	4,00
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	12,00
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	12,00
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	5,00
09.09.051	UN	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	2,00
09.09.083	UN	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	52,00
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	11,00
09.13.012	UN	PP-02 PARA RAO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	1,00
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	1.826,00
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	892,00
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	62,00
09.13.031	UN	TUBO DE PVC 2"x 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	62,00
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	96,00
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	62,00
10.01.077	M2	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST.	7,86
11.03.003	M2	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	56,00
11.03.010	M2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	5,00
11.04.022	M	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	18,00
12.02.009	M2	REVESTIMENTO COM GESSO	118,99
12.04.004	M2	CHAPISCO	572,91
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	572,91
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	9,18
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	9,18
13.02.005	M2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	7,86
13.02.023	M2	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	0,50
13.02.059	CJ	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	22,00
13.06.083	M	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	1,84
13.07.002	M	PE-02 PEITORIL	5,00
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	1,89
15.01.004	M2	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	131,30
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	7,86
15.02.019	M2	ESMALTE	118,99
15.03.007	M2	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	11,59
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	5,15
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	28,44

Eng. Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitana
CREA 92.262/D

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 72/00059/15/01 - PI: 2008/00727 - CÓD. OBRA: 134608- EE CID DE HIROSHIMA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
15.03.061	M	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	4,40
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	965,13


Eng. Antonio Corrêa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D
