



2F140FD219

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00126/20/01-003 Item: 002
PI: 2019/00402
ESCOLA: 111102 - EE IJIMA
LOCAL: RUA KANGO TAKEUTI, 100 - CEP: 08533-240 - VILA DO AMERICANO - FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 679.144,74

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 679.110,65

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230201622072	2603541099	ENEGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL:
210 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 14

TOTAL DE DIAS:
224 dia(s)

DATA DE INÍCIO:

05-02-2021

DATA DE TÉRMINO:

03-09-2021

DATA DE EMISSÃO TRP:

05-10-2021

ATRASOS JUSTIFICADOS:

50 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

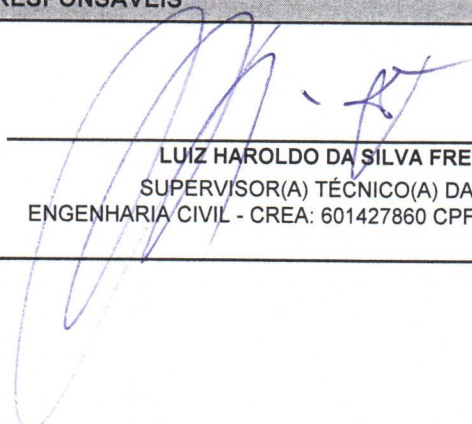
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 17 de agosto de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198.08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	2.400,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	2,16 2,16	0,00	77,09 77,09	21,38 21,38	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	89,40 89,40	24,79 24,79	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	24,00 68,13	6,00 6,00	0,00	408,78 408,78	113,38 113,38	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	10,50 6,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,50 6,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,50 29,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	18,10 51,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	446,00 8,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	35,00 63,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	124,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,90 335,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.002	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00 0,00	0,43 0,43	0,00	86,76 86,76	24,06 24,06	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	234,00 8,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	2,60 345,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	26,00 63,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	9,52 78,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	2,88 5,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	6,00 416,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	8,00 937,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198.08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00 295,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.053	BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM)	UN	2,00 1.186,31	4,00 4,00	0,00	4.745,24 4.745,24	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.054	BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM)	UN	2,00 1.389,09	2,00 2,00	0,00	2.738,18 2.738,18	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.060	BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA	UN	2,00 627,55	1,00 1,00	0,00	627,55 627,55	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	2,00 1.023,72	6,20 6,20	0,00	6.347,06 6.347,06	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.688,89 2.688,89	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	2,30 141,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	1,70 632,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	2,50 704,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	12,00 920,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00 46,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 1.977,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00 10,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 45,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00 50,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	2,00 2.346,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	2,00 807,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	8,00 443,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	30,00 280,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	10,98 26,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	8,00 207,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	18,00 35,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
-Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IIJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198,08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IIJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	120,00 8,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	360,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00 0,00	3.880,76 3.880,76	0,00	57.396,44 57.396,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.033	TELHA DE PVC RIGIDO TRANSLUCIDA - PERFIL FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	0,00 0,00	185,00 185,00	0,00	10.755,90 10.755,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM	M2	420,00 70,00	1.398,60 1.398,60	0,00	97.902,00 97.902,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	84,00 69,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	210,00 6,50	1.583,60 1.583,60	0,00	10.293,40 10.293,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	120,00 2,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	24,00 9,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	4,00 447,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	24,00 100,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00 19,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00 26,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00 37,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00 50,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00 122,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00 85,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	8,00 90,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	8,00 353,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00 266,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00 339,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IIJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198,08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IIJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00 156,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	9,00 113,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00 37,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 41,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00 49,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00 53,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00 41,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	84,00 58,19	281,00 281,00	0,00	16.351,39 16.351,39	4.535,36 4.535,36	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	88,00 88,00	0,00	8.066,96 8.066,96	2.237,52 2.237,52	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00 61,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00 87,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00 373,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00 1.120,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	19,00 195,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00 2.269,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00 424,18	2,00 2,00	0,00	848,36 848,36	235,30 235,30	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	120,00 6,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00 0,00	358,00 358,00	0,00	1.274,48 1.274,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00 59,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00 77,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00 125,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198.08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,59	0,00		0,00	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00	1.398,60	0,00	9.762,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.398,60		9.762,22	0,00		
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,63	0,00		0,00	0,00		
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00	226,00	0,00	4.942,62	1.370,92	0,00	0,00
			0,00	226,00		4.942,62	1.370,92		
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,90	0,00		0,00	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,23	0,00		0,00	0,00		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,34	0,00		0,00	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,43	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	84,00	547,90	46,00	19.751,79	5.478,50	1.658,30	459,96
			36,05	501,90		18.093,49	5.018,54		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,99	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420,25	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			741,92	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,18	0,00		0,00	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,37	0,00		0,00	0,00		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113,51	0,00		0,00	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.051,51	0,00		0,00	0,00		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,16	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,19	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.400,00	2.866,00	0,00	8.970,58	2.488,14	0,00	0,00
			3,13	2.866,00		8.970,58	2.488,14		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,05	0,00		0,00	0,00		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	120,00	1.052,00	0,00	5.365,20	1.488,12	0,00	0,00
			5,10	1.052,00		5.365,20	1.488,12		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,50	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IIJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198,08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IIJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	100,00 3,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2". ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	6,00 198,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2". ELETROD. DE AÇO GALV. A QUENTE	UN	1,00 165,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP. SIMPL. CX.4"X4". ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	4,00 239,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00 0,00	52,00 52,00	0,00	4.204,20 4.204,20	1.166,10 1.166,10	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00 159,10	15,00 15,00	0,00	2.386,50 2.386,50	661,93 661,93	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	2,00 185,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2". ELETROD. PVC RÍGIDO	UN	4,00 130,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETROD. PVC RÍGIDO	UN	6,00 120,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	2,00 88,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00 179,90	15,00 15,00	0,00	2.698,50 2.698,50	748,47 748,47	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	29,00 29,00	0,00	17.714,94 17.714,94	4.913,54 4.913,54	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	24,00 157,30	162,00 151,00	11,00	25.482,60 23.752,30	7.068,06 6.588,13	1.730,30 1.730,30	479,93 479,93
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	6,00 231,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	12,00 54,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	8,00 192,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.024	CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	6.415,92 6.415,92	1.779,57 1.779,57	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	4,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	371,20 371,20	0,00	1.726,08 1.726,08	478,76 478,76	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.400,00 0,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	4,00 16,35	64,00 64,00	0,00	1.046,40 1.046,40	290,23 290,23	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM.FLUORESC.C/PLAFON E PEND. OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00 6,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IIJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198,08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IIJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	44,00	214,00	0,00	1.311,82	363,85	0,00	0,00
			6,13	214,00		1.311,82	363,85		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00	18,00	0,00	1.103,76	306,14	0,00	0,00
			61,32	18,00		1.103,76	306,14		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.400,00	3.258,00	0,00	2.280,60	632,56	0,00	0,00
			0,70	3.258,00		2.280,60	632,56		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,77	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00	56,00	0,00	807,52	223,96	0,00	0,00
			0,00	56,00		807,52	223,96		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	262,00	0,00	1.050,62	291,39	0,00	0,00
			0,00	262,00		1.050,62	291,39		
09.84.037	CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42)	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,67	0,00		0,00	0,00		
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00	96,00	0,00	6.687,36	1.854,85	0,00	0,00
			0,00	96,00		6.687,36	1.854,85		
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,27	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,13	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,51	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	238,00	0,00	7.056,70	1.957,29	0,00	0,00
			29,65	238,00		7.056,70	1.957,29		
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇÃO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00	192,40	0,00	10.014,42	0,00	0,00	0,00
			0,00	192,40		10.014,42	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,59	0,00		0,00	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,33	0,00		0,00	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,48	0,00		0,00	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,59	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,34	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,55	0,00		0,00	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	154,00	472,00	0,00	3.086,88	856,20	0,00	0,00
			6,54	472,00		3.086,88	856,20		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	60,37	0,00	1.378,24	382,28	0,00	0,00
			0,00	60,37		1.378,24	382,28		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,01	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IIJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198.08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IIJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	0,00 0,00	2.009,45 2.009,45	0,00	13.764,71 13.764,71	1.101,86 1.101,86	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	154,00 110,00	60,37 60,37	0,00	6.640,70 6.640,70	1.841,92 1.841,92	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	154,00 12,00	30,28 30,28	0,00	363,36 363,36	100,78 100,78	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	14,16 14,16	0,00	2.857,34 2.857,34	792,53 792,53	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	64,00 26,77	60,37 60,37	0,00	1.616,10 1.616,10	448,25 448,25	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	1.800,00 29,63	2.384,45 2.384,45	0,00	70.651,24 70.651,24	7.848,10 7.848,10	0,00	0,00
13.80.022	COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO	M2	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	0,00	14.146,00 14.146,00	3.923,65 3.923,65	0,00	0,00
13.80.057	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	0,00 0,00	919,59 919,59	0,00	15.734,17 15.734,17	596,30 596,30	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	180,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 12,00	1.821,56 1.608,56	213,00	21.858,72 19.302,72	6.062,91 5.353,96	2.556,00	708,95
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	40,00 32,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	2,00 1.101,14	2,00 2,00	0,00	2.202,28 2.202,28	610,84 610,84	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	219,60 3,13	295,68 295,68	0,00	925,47 925,47	256,69 256,69	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	5.600,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00 0,00	128,06 0,00	128,06	1.827,41 0,00	506,86 0,00	1.827,41	506,86
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	960,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	3.097,58 3.034,94	62,64	35.993,87 35.266,00	9.983,55 9.781,67	727,87	201,88
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.100,00 11,00	876,61 876,61	0,00	9.642,71 9.642,71	2.674,58 2.674,58	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	320,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	2,99 568,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	360,00 25,00	472,00 472,00	0,00	11.800,00 11.800,00	3.272,94 3.272,94	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	360,00 6,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

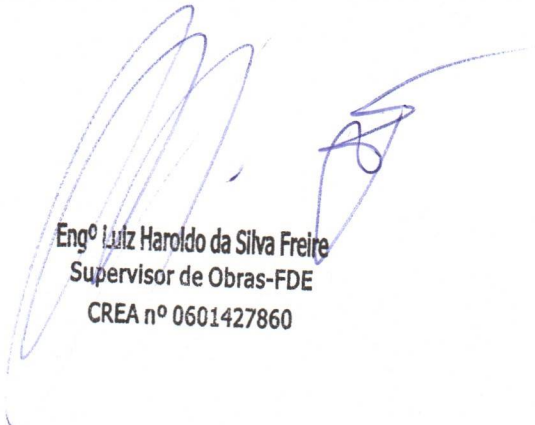
Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198.08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	472,00	0,00	21.494,88	5.962,00	0,00	0,00
			0,00	472,00		21.494,88	5.962,00		
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	0,00	1.941,00	1.941,00	1.339,29	371,47	1.339,29	371,47
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			783,78	0,00		0,00	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	3,00	3,00	2.555,10	708,70	2.555,10	708,70
			851,70	0,00		0,00	0,00		
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00	3,00	0,00	15.791,55	4.380,07	0,00	0,00
			0,00	3,00		15.791,55	4.380,07		
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.198,30	0,00		0,00	0,00		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,49	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	0,00		0,00	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,98	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	32,00	75,00	0,00	1.370,25	228,03	0,00	0,00
			18,27	75,00		1.370,25	228,03		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00	6,75	0,00	2.039,91	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,75		2.039,91	0,00		
16.06.087	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,54	0,00		0,00	0,00		
16.06.088	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,76	0,00		0,00	0,00		
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,43	0,00		0,00	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.177,56	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	3,00	0,00	1.491,72	413,75	0,00	0,00
			497,24	3,00		1.491,72	413,75		
16.15.030	IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,89	0,00		0,00	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,45	0,00		0,00	0,00		
16.30.010	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,21	0,00		0,00	0,00		
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,37	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-002	Valor	679.144,74
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	20/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	29.3700%
Nro. Medição	8	Prédio	111102 - EE IJIMA		
PI	2019/00402	Situação	Aprovada	Orc. FDE	961.713,01
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4198,08
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE IJIMA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	12,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	12,00 4,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.020	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS	M2	18,00 14,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.39.004	FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM)	M2	12,00 269,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.40.002	ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO	M3	12,00 943,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	44,00 22,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	292,60 1,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	120,00 150,00	1,50 1,50	0,00	225,00 225,00	62,40 62,40	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	470,00 470,00	0,00	25.530,40 25.530,40	7.081,32 7.081,32	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	840,00 65,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	360,00 52,00	28,80 0,00	28,80	1.497,60 0,00	415,38 0,00	1.497,60 0,00	415,38 0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	240,00 62,75	136,50 124,00	12,50	8.565,37 7.781,00	2.375,75 2.158,20	784,37 0,00	217,55 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	360,00 42,00	15,00 15,00	0,00	630,00 630,00	174,74 174,74	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	472,00 472,00	0,00	4.040,32 4.040,32	1.120,65 1.120,65	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.021	TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	604,23 604,23	167,59 167,59	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	1,00 377,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	270,00 240,00	30,00	10.767,60 9.571,20	2.986,58 2.654,74	1.196,40 0,00	331,84 0,00
16.80.026	TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40	M	1,00 535,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	32,00 400,00	13,00 13,00	0,00	5.200,00 5.200,00	1.442,30 1.442,30	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
663.238,01	679.110,65	15.872,64	663.238,01	679.110,65	15.872,64	
			105.502,62	109.905,14	4.402,52	
			768.740,63	789.015,79	VALOR A LIBERAR 20.275,16	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860
