



2F1A05529F

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°.: 70/00359/21/02-001 Item: 001 Data de Assinatura do Contrato: 11-07-2022
PI: 2021/02029 N° SP sem Papel:
ESCOLA: 133155 - EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI
LOCAL: RUA DA EDUCAÇÃO, 15 - CEP: 09783-610 - VILA ESPERANCA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 261.507,57	R\$ 261.392,63

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	2603541099	28027230221070784	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 167 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 20-07-2022	DATA DE TÉRMINO: 19-12-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 19-10-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4


REVISÃO GERAL DA COBERTURA, NOS SANITÁRIOS, NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS E CAIXILHOS.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 13 de abril de 2023

RESPONSÁVEIS

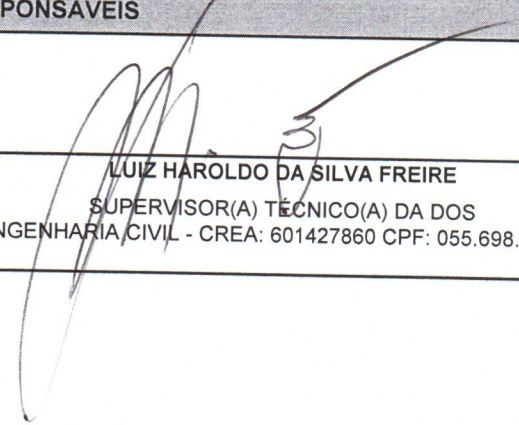

LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00359/21/02-001-001	Valor	261.507,57
Data base	10/2021	Assinatura	11/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	19/07/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	19/12/2022	Redução	20.5500%
Nro. Medição	4	Prédio	133155 - EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI		
PI	2021/02029	Situação	Aprovada	Orc. FDE	329.135,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1981.77
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	10,00	0,00	648,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		648,50	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,64	0,00		0,00	0,00		
04.01.042	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM	M2	0,00	1,68	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,68		98,68	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	7,50	10,50	0,00	6.673,06	0,00	0,00	0,00
			635,53	10,50		6.673,06	0,00		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,50	1,50	0,00	1.083,28	0,00	0,00	0,00
			722,19	1,50		1.083,28	0,00		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,20	2,92	0,00	6.280,71	0,00	0,00	0,00
			2.150,93	2,92		6.280,71	0,00		
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	0,90	0,40	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00
			247,66	0,40		99,06	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,58	0,00		0,00	0,00		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	0,00	28,80	0,00	141,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	28,80		141,40	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	8,00	8,00	0,00	1.835,36	0,00	0,00	0,00
			229,42	8,00		1.835,36	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	0,00	10,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		99,50	0,00		
05.81.006	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			326,85	0,00		0,00	0,00		
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	0,00	2,00	0,00	8.604,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		8.604,72	0,00		
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			809,31	0,00		0,00	0,00		
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICAÇÃO DE PASSAROS	M2	72,53	74,60	0,00	3.964,99	0,00	0,00	0,00
			53,15	74,60		3.964,99	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,19	0,00		0,00	0,00		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,64	0,00		0,00	0,00		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,11	0,00		0,00	0,00		
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,24	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,74	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00359/21/02-001-001	Valor	261.507,57
Data base	10/2021	Assinatura	11/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	19/07/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	19/12/2022	Redução	20.5500%
Nro. Medição	4	Prédio	133155 - EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI		
PI	2021/02029	Situação	Aprovada	Orc. FDE	329.135,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1981.77
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,78	0,00		0,00	0,00		
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,02	0,00		0,00	0,00		
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM	M2	0,00	906,18	0,00	104.863,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	906,18		104.863,14	0,00		
07.04.102	RUFO LIÇO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101,94	0,00		0,00	0,00		
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	0,00	1.086,33	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.086,33		380,21	0,00		
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	1.004,06	906,18	0,00	3.688,15	0,00	0,00	0,00
			4,07	906,18		3.688,15	0,00		
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	41,73	38,30	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00
			1,54	38,30		58,98	0,00		
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	498,63	1.086,33	0,00	8.212,65	0,00	0,00	0,00
			7,56	1.086,33		8.212,65	0,00		
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,26	0,00		0,00	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	34,36	0,00	224,71	0,00	0,00	0,00
			0,00	34,36		224,71	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	1.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,56	0,00		0,00	0,00		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,64	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00	21,60	0,00	470,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	21,60		470,66	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00	25,00	0,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	25,00		1.018,50	0,00		
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	9,00	8,00	0,00	4.284,40	0,00	0,00	0,00
			535,55	8,00		4.284,40	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	2,00	0,00	736,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		736,72	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00	9,20	0,00	427,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	9,20		427,43	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00	25,20	0,00	1.555,59	0,00	0,00	0,00
			0,00	25,20		1.555,59	0,00		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,44	0,00		0,00	0,00		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	0,00	132,00	0,00	9.104,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	132,00		9.104,04	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	16,00	0,00	1.679,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,00		1.679,36	0,00		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	38,30	0,00	7.042,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	38,30		7.042,98	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00359/21/02-001-001	Valor	261.507,57
Data base	10/2021	Assinatura	11/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	19/07/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	19/12/2022	Redução	20.5500%
Nro. Medição	4	Prédio	133155 - EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI		
PI	2021/02029	Situação	Aprovada	Orc. FDE	329.135,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1981.77
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	5,00	0,00	6.745,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	5,00		6.745,30	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			707,52	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00	8,00	0,00	2.714,64	0,00	0,00	0,00
			339,33	8,00		2.714,64	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00	2,00	0,00	935,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		935,14	0,00		
08.17.013	MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			580,82	0,00		0,00	0,00		
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			441,50	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	90,40	173,00	0,00	1.425,52	0,00	0,00	0,00
			8,24	173,00		1.425,52	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	16,80	16,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00
			4,74	16,00		75,84	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	0,00	16,00	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,00		871,20	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00	12,00	0,00	478,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,00		478,08	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	96,40	100,80	0,00	1.151,13	0,00	0,00	0,00
			11,42	100,80		1.151,13	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	1.049,39	773,66	0,00	2.506,65	0,00	0,00	0,00
			3,24	773,66		2.506,65	0,00		
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,68	0,00		0,00	0,00		
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154,14	0,00		0,00	0,00		
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133,49	0,00		0,00	0,00		
09.03.059	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00	45,00	0,00	1.228,05	0,00	0,00	0,00
			0,00	45,00		1.228,05	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405,46	0,00		0,00	0,00		
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,57	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	117,90	0,00	5.726,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	117,90		5.726,40	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,82	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.071,66	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	793,92	90,00	90,00	407,70	44,76	407,70	0,00
			4,53	0,00		0,00	44,76		

Critério	Unitária	Contrato	70/00359/21/02-001-001	Valor	261.507,57
Data base	10/2021	Assinatura	11/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	19/07/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	19/12/2022	Redução	20.5500%
Nro. Medição	4	Prédio	133155 - EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI		
PI	2021/02029	Situação	Aprovada	Orc. FDE	329.135,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1981.77
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,52	0,00		0,00	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	2,00	2,00	415,30	45,59	415,30	0,00
			0,00	0,00		0,00	45,59		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291,43	0,00		0,00	0,00		
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136,51	0,00		0,00	0,00		
09.08.030	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208,88	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	27,00	0,00	6.440,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	27,00		6.440,58	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	6,00	44,00	4,00	9.970,84	99,52	906,44	0,00
			226,61	40,00		9.064,40	99,52		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	90,00	90,00	86,40	9,48	86,40	0,00
			0,00	0,00		0,00	9,48		
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	1.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,45	0,00		0,00	0,00		
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	78,00	169,00	0,00	819,65	0,00	0,00	0,00
			4,85	169,00		819,65	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	4,00	4,00	9,80	1,07	9,80	0,00
			0,00	0,00		0,00	1,07		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	72,00	102,00	0,00	569,16	0,00	0,00	0,00
			5,58	102,00		569,16	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,17	0,00		0,00	0,00		
09.85.089	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	0,00	100,00	0,00	3.723,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,00		3.723,00	0,00		
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	126,92	100,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00
			47,78	100,00		4.778,00	0,00		
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,94	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,25	0,00		0,00	0,00		
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,33	0,00		0,00	0,00		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,82	0,00		0,00	0,00		
11.04.041	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO	M	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,04	0,00		0,00	0,00		
11.50.001	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	0,00	100,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,00		818,00	0,00		
12.01.001	CHAPISCO	M2	31,80	20,00	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00
			13,24	20,00		264,80	0,00		


Critério	Unitária	Contrato	70/00359/21/02-001-001	Valor	261.507,57
Data base	10/2021	Assinatura	11/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	19/07/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	19/12/2022	Redução	20.5500%
Nro. Medição	4	Prédio	133155 - EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI		
PI	2021/02029	Situação	Aprovada	Orc. FDE	329.135,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1981.77
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,43	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00	89,60	0,00	524,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	89,60		524,16	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	109,60	0,00	3.958,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	109,60		3.958,75	0,00		
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	91,20	89,60	0,00	8.448,38	0,00	0,00	0,00
			94,29	89,60		8.448,38	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00	89,60	0,00	1.235,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	89,60		1.235,58	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	31,50	0,00	1.067,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,50		1.067,22	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	0,00	31,50	0,00	874,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,50		874,75	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	32,02	31,50	0,00	4.428,58	0,00	0,00	0,00
			140,59	31,50		4.428,58	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	2,20	0,00	468,51	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,20		468,51	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	0,00	31,50	0,00	811,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,50		811,12	0,00		
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,24	0,00		0,00	0,00		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,97	0,00		0,00	0,00		
15.02.019	ESMALTE	M2	0,00	59,28	59,28	1.503,34	165,06	1.503,34	0,00
			0,00	0,00		0,00	165,06		
15.03.025	ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	26,78	0,00	788,93	0,00	0,00	0,00
			0,00	26,78		788,93	0,00		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	44,05	44,05	977,91	107,37	977,91	0,00
			0,00	0,00		0,00	107,37		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,96	0,00		0,00	0,00		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00	23,18	23,18	401,47	44,08	401,47	0,00
			0,00	0,00		0,00	44,08		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	390,86	58,42	0,00	562,58	0,00	0,00	0,00
			9,63	58,42		562,58	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00	73,09	73,09	1.163,59	127,76	1.163,59	0,00
			0,00	0,00		0,00	127,76		
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,94	0,00		0,00	0,00		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168,78	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,67	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00359/21/02-001-001	Valor	261.507,57
Data base	10/2021	Assinatura	11/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	19/07/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	19/12/2022	Redução	20.5500%
Nro. Medição	4	Prédio	133155 - EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI		
PI	2021/02029	Situação	Aprovada	Orc. FDE	329.135,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1981.77
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA NAIL FRANCO DE MELLO BONI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00	49,00	0,00	1.344,07	0,00	0,00	0,00
			27,43	49,00		1.344,07	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,80	0,00		0,00	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,21	0,00		0,00	0,00		
16.35.001	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	10,00	10,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
			5,64	10,00		56,40	0,00		
16.35.002	ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	6,00	6,00	0,00	1.237,14	0,00	0,00	0,00
			206,19	6,00		1.237,14	0,00		
16.35.008	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	6,00	6,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00
			8,28	6,00		49,68	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	M2	6,00	6,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00
			11,09	6,00		66,54	0,00		
16.36.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM)	M2	6,00	6,00	0,00	2.591,76	0,00	0,00	0,00
			431,96	6,00		2.591,76	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	43,43	94,31	0,00	3.394,21	0,00	0,00	0,00
			35,99	94,31		3.394,21	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
255.520,68	261.392,63	5.871,95	255.520,68	261.392,63	5.871,95	
			0,00	644,69	0,00	
			255.520,68	262.037,32	VALOR A LIBERAR 5.871,95	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860
