



2F14101145

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00224/20/02-001 Item: 002
PI: 2012/00850
ESCOLA: 108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO
LOCAL: RUA TAPUIAS, 509 - CEP: 09911-630 - VILA CONCEICAO - DIADEMA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 380.174,07

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 380.102,87

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210939739	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL:
120 dia(s)

1 - 0

2 - 0

3 - 0

4 - 6

TOTAL DE DIAS:
126 dia(s)

DATA DE INÍCIO:

29-07-2021

DATA DE TÉRMINO:

26-11-2021

DATA DE EMISSÃO TRP:

21-02-2022

ATRASOS JUSTIFICADOS:

81 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
RENOVAÇÃO DO AVCB, REVISÃO DOS SANITÁRIOS, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECONSTRUÇÃO DE MURO,
DO FORRO, TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em
epigrafe.

São Paulo, 10 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269.78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.025	REATERRO INTERNO APOLOADO	M3	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,12	0,00		0,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			407,50	0,00		0,00	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			577,01	0,00		0,00	0,00		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.002,01	0,00		0,00	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,73	0,00		0,00	0,00		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,11	0,00		0,00	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			573,50	0,00		0,00	0,00		
05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.312,86	0,00		0,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	0,00		0,00	0,00		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,35	0,00		0,00	0,00		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,32	0,00		0,00	0,00		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,14	0,00		0,00	0,00		
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143,19	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	0,00	14,04	0,00	3.559,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,04		3.559,28	0,00		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	31,20	0,00	9.463,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,20		9.463,58	0,00		
06.03.103	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	11,36	0,00	1.975,39	0,00	0,00	0,00
			0,00	11,36		1.975,39	0,00		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00	188,20	0,00	5.497,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	188,20		5.497,32	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	2.563,40	0,00	12.047,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.563,40		12.047,98	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,64	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,21	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269,78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,17	0,00		0,00	0,00		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXÕES	M	55,00	22,00	0,00	5.832,86	0,00	0,00	0,00
			265,13	22,00		5.832,86	0,00		
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,83	0,00		0,00	0,00		
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			353,74	0,00		0,00	0,00		
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			537,50	0,00		0,00	0,00		
08.08.010	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	0,00	10,00	0,00	1.493,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		1.493,50	0,00		
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	1,00	0,00	798,19	0,00	0,00	0,00
			798,19	1,00		798,19	0,00		
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	0,00	6,00	0,00	5.558,46	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		5.558,46	0,00		
08.08.031	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2"	M	0,00	150,00	0,00	2.938,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	150,00		2.938,50	0,00		
08.08.037	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4"	UN	0,00	10,00	0,00	523,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		523,10	0,00		
08.08.042	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,80	0,00		0,00	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00	6,00	0,00	2.961,60	0,00	0,00	0,00
			493,60	6,00		2.961,60	0,00		
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	6,00	13,00	0,00	1.843,40	0,00	0,00	0,00
			141,80	13,00		1.843,40	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	6,00	9,00	0,00	1.437,75	0,00	0,00	0,00
			159,75	9,00		1.437,75	0,00		
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00	1,00	0,00	1.715,01	0,00	0,00	0,00
			1.715,01	1,00		1.715,01	0,00		
08.08.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00	1,00	0,00	2.628,66	0,00	0,00	0,00
			2.628,66	1,00		2.628,66	0,00		
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	20,00	20,00	0,00	4.553,40	0,00	0,00	0,00
			227,67	20,00		4.553,40	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,47	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,15	0,00		0,00	0,00		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	4,00	0,00	217,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		217,32	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,16	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269.78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	160,00 14,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	81,00 26,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00 112,16	2,00 2,00	0,00	224,32 224,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	1,00 1.442,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,00 342,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	487,95 487,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	70,50 70,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	240,00 4,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	360,00 3,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	12,00 69,64	16,00 16,00	0,00	1.114,24 1.114,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	10,00 10,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	179,94 179,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	240,02 240,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	9,00 77,99	6,00 6,00	0,00	467,94 467,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.014	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	214,30 214,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	200,91 200,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.010	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	113,32 113,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.011	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	625,92 625,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.015	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	267,76 267,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	1.434,88 1.434,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00 103,26	8,00 8,00	0,00	826,08 826,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	8,00 139,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269,78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216,60	0,00		0,00	0,00		
08.82.046	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	UN	0,00	4,00	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		85,84	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	40,00	92,30	0,00	1.063,29	0,00	0,00	0,00
			11,52	92,30		1.063,29	0,00		
09.02.084	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			664,03	0,00		0,00	0,00		
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,42	0,00		0,00	0,00		
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			217,21	0,00		0,00	0,00		
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,64	0,00		0,00	0,00		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,00	12,80	0,00	119,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,80		119,55	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00	4,80	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,80		68,54	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	6,40	1,44	0,00	511,81	0,00	0,00	0,00
			355,43	1,44		511,81	0,00		
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260,12	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	265,00	309,90	0,00	15.318,35	0,00	0,00	0,00
			49,43	309,90		15.318,35	0,00		
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			287,60	0,00		0,00	0,00		
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	0,00	2,00	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		108,62	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	30,00	70,00	0,00	6.314,70	0,00	0,00	0,00
			90,21	70,00		6.314,70	0,00		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	16,00	6,00	0,00	738,72	0,00	0,00	0,00
			123,12	6,00		738,72	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	50,00	85,00	0,00	2.187,90	0,00	0,00	0,00
			25,74	85,00		2.187,90	0,00		
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.464,19	0,00		0,00	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	3,00	0,00	4.509,03	0,00	0,00	0,00
			1.503,01	3,00		4.509,03	0,00		
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	2,00	2,00	0,00	1.446,44	0,00	0,00	0,00
			723,22	2,00		1.446,44	0,00		
09.06.007	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,04	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	800,00	3.558,40	0,00	11.458,04	0,00	0,00	0,00
			3,22	3.558,40		11.458,04	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269.78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	500,00 6,55	594,90 594,90	0,00	3.896,59 3.896,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	257,90 257,90	0,00	2.287,57 2.287,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	171,90 171,90	0,00	2.126,40 2.126,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A- 250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	8,00 219,10	105,00 105,00	0,00	23.005,50 23.005,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	9,00 433,67	16,00 16,00	0,00	6.938,72 6.938,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.056	CIGARRA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00 285,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	UN	1,00 160,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	9,00 233,51	16,00 16,00	0,00	3.736,16 3.736,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 118,21	16,00 16,00	0,00	1.891,36 1.891,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00 370,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	16,00 145,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	52,00 68,93	73,00 73,00	0,00	5.031,89 5.031,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 35,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	2.226,40 2.226,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00 388,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	3,00 981,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	0,00 0,00	428,20 428,20	0,00	10.349,58 10.349,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	241,50 6,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	30,00 251,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	28,00 45,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	28,00 52,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	16,00 42,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269,78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	0,00	1,00	0,00	1.398,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.398,50	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,60	0,00		0,00	0,00		
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE DE FIXAÇÃO.	M	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,77	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE ATÉ 2"	M	0,00	297,60	0,00	1.020,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	297,60		1.020,76	0,00		
09.52.017	REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM2	M	1.812,00	4.888,40	0,00	5.817,19	0,00	0,00	0,00
			1,19	4.888,40		5.817,19	0,00		
09.52.030	REMOÇÃO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSÍVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00	108,00	0,00	370,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	108,00		370,44	0,00		
09.54.001	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,06	0,00		0,00	0,00		
09.54.002	REMOÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA DA BOIA	UN	0,00	2,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		32,98	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00	1,44	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,44		79,17	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	32,00	76,00	0,00	231,04	0,00	0,00	0,00
			3,04	76,00		231,04	0,00		
09.66.004	RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS	M	0,00	465,00	36,80	6.389,09	0,00	505,63	0,00
			0,00	428,20		5.883,46	0,00		
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB.CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	0,00	1,44	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,44		243,95	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	32,00	76,00	0,00	414,96	0,00	0,00	0,00
			5,46	76,00		414,96	0,00		
09.76.004	RECOLOCAÇÃO DE CABO AÇO E ESTICADORES, OU DE CABO COBRE NU P/ATERR. P.RAIOS	M	0,00	36,80	36,80	202,03	0,00	202,03	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.80.051	MAO FRANCESA DE 700 MM	UN	0,00	18,00	0,00	640,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00		640,98	0,00		
09.83.037	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	UN	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,89	0,00		0,00	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,30	0,00		0,00	0,00		
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00	92,00	16,00	5.444,56	0,00	946,88	0,00
			0,00	76,00		4.497,68	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,64	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDUTELE DE 3/4"	UN	0,00	122,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	122,00		2.501,00	0,00		
09.85.084	MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFÁSICO	UN	0,00	2,00	0,00	1.725,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.725,78	0,00		
09.85.087	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	0,00	156,00	28,00	3.461,64	0,00	621,32	0,00
			0,00	128,00		2.840,32	0,00		

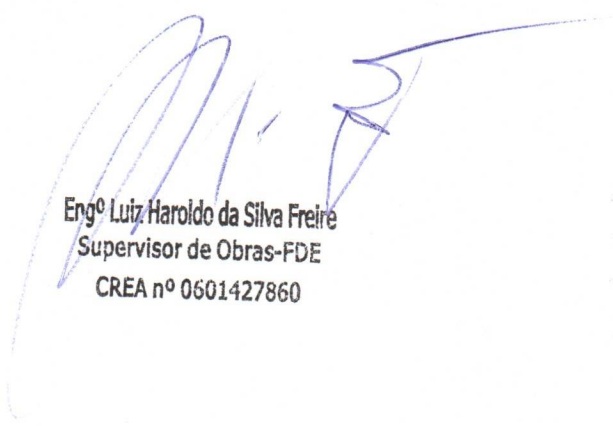
Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269.78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	55,00 80,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	0,00 0,00	64,08 64,08	0,00	1.461,02 1.461,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	0,00 0,00	64,08 64,08	0,00	1.466,15 1.466,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.50.003	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M2	54,50 4,48	64,08 64,08	0,00	287,07 287,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	60,20 65,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	60,20 54,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	326.375,00 0,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATAÇAO	M	261,10 11,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.021	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA	M	261,10 41,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	60,20 12,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.80.051	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	30,00 46,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.012,00 8,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	1.012,00 64,67	817,45 817,45	0,00	52.864,49 52.864,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	50,60 132,44	65,39 65,39	0,00	8.660,24 8.660,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.001	CAIACAO	M2	276,00 10,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	261,80 261,80	0,00	5.979,51 5.979,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	87,60 20,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	27,50 11,77	188,00 188,00	0,00	2.212,76 2.212,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.029	VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 2 DEMÃOS	M2	111,00 31,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	3,00 782,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	25,13 25,13	0,00	434,74 434,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	48,00 618,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-002	Valor	380.174,07
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	26/11/2021	Redução	42.3000%
Nro. Medição	8	Prédio	108161 - EE PROF RIOLANDO CANNO		
PI	2012/00850	Situação	Aprovada	Orc. FDE	658.936,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4269,78
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF RIOLANDO CANNO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,63	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,31	0,00		0,00	0,00		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,54	0,00		0,00	0,00		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,70	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	12,00	30,00	0,00	4.906,20	0,00	0,00	0,00
			163,54	30,00		4.906,20	0,00		
16.05.038	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,50	0,00		0,00	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	12,00	30,00	0,00	3.011,70	0,00	0,00	0,00
			100,39	30,00		3.011,70	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	95,00	0,00	1.269,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	95,00		1.269,20	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	21,39	30,00	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00
			3,87	30,00		116,10	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	7,13	6,00	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00
			69,60	6,00		417,60	0,00		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	0,00	258,42	258,42	2.124,21	0,00	2.124,21	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	150,00	817,45	0,00	31.316,50	0,00	0,00	0,00
			38,31	817,45		31.316,50	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	0,00	180,00	0,00	8.020,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	180,00		8.020,80	0,00		
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	0,00	132,00	0,00	16.969,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	132,00		16.969,92	0,00		
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	0,00	188,60	0,00	584,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	188,60		584,66	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00	261,80	0,00	1.612,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	261,80		1.612,68	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,73	0,00		0,00	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,59	0,00		0,00	0,00		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	122,00	817,45	0,00	10.765,80	0,00	0,00	0,00
			13,17	817,45		10.765,80	0,00		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	122,00	817,45	0,00	14.640,52	0,00	0,00	0,00
			17,91	817,45		14.640,52	0,00		
16.80.091	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	0,00	2,00	0,00	423,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		423,22	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	174,15	125,02	3,00	3.649,33	0,00	87,57	0,00
			29,19	122,02		3.561,76	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
375.615,23	380.102,87	4.487,64	375.615,23	380.102,87	4.487,64	
			0,00	0,00	0,00	
			375.615,23	380.102,87	VALOR A LIBERAR 4.487,64	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860
