



2F140F857C

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00125/20/01-002 Item: 001
PI: 2018/00967
ESCOLA: 22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS
LOCAL: RUA BOM JESUS, 909 3344000 VILA REGENTE FEIJO - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 652.021,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 651.909,78

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230210147724	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS**TIPO DE OBRA:** Reforma**PRAZO CONTRATUAL:**
210 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 13

TOTAL DE DIAS:
225 dia(s)**DATA DE INÍCIO:**
12-02-2021**DATA DE TÉRMINO:**
10-09-2021**DATA DE EMISSÃO TRP:**
16-09-2021**ATRASOS JUSTIFICADOS:**
0 dia(s)**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS**
0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 13 de maio de 2022

RESPONSÁVEIS


Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.024	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM<100CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.025	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES DIAM >100CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.751,88 1.751,88	485,91 485,91	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	1,00 1.200,00	6,00 6,00	0,00	7.200,00 7.200,00	1.997,04 1.997,04	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.033	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	UN	1,00 2.174,19	1,00 1,00	0,00	2.174,19 2.174,19	603,05 603,05	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.034	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	UN	3,00 4.000,00	4,00 4,00	0,00	16.000,00 16.000,00	4.437,88 4.437,88	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.035	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM	UN	3,00 6.176,12	1,00 1,00	0,00	6.176,12 6.176,12	1.713,06 1.713,06	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.036	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 150CM<DIAM<250CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	19.856,42 19.856,42	5.507,54 5.507,54	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	24,00 65,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	10,50 7,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,50 6,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,50 31,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	18,10 54,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	220,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	12,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	35,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,70 199,44	3,73 3,73	0,00	743,91 743,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	4,14 420,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	26,00 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,70 391,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,85	0,00		0,00	0,00		
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	M2	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,63	0,00		0,00	0,00		
04.01.064	ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM	M2	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,41	0,00		0,00	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,05	0,00		0,00	0,00		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,43	0,00		0,00	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	16,00	20,00	0,00	8.000,00	2.218,94	0,00	0,00
			400,00	20,00		8.000,00	2.218,94		
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,01	0,00		0,00	0,00		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,54	0,00		0,00	0,00		
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	0,00	27,52	0,00	2.600,08	721,17	0,00	0,00
			0,00	27,52		2.600,08	721,17		
05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	0,00	15,00	0,00	1.515,15	420,25	0,00	0,00
			0,00	15,00		1.515,15	420,25		
05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	0,00	20,00	0,00	1.734,80	481,17	0,00	0,00
			0,00	20,00		1.734,80	481,17		
05.80.081	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO	UN	0,00	45,00	0,00	615,60	170,73	0,00	0,00
			0,00	45,00		615,60	170,73		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.094	BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO	M	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,72	0,00		0,00	0,00		
06.80.096	PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO"	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,79	0,00		0,00	0,00		
07.04.100	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,60	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,08	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	252,00	73,92	0,00	558,83	155,00	0,00	0,00
			7,56	73,92		558,83	155,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	126,00	36,96	0,00	194,04	53,82	0,00	0,00
			5,25	36,96		194,04	53,82		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	0,00	7,00	0,00	52,92	14,67	0,00	0,00
			0,00	7,00		52,92	14,67		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00	15,00	0,00	28,19	7,81	0,00	0,00
			0,00	15,00		28,19	7,81		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	252,00	73,92	0,00	1.108,80	307,54	0,00	0,00
			15,00	73,92		1.108,80	307,54		
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	0,00	7,00	0,00	45,92	12,73	0,00	0,00
			0,00	7,00		45,92	12,73		
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,46	0,00		0,00	0,00		
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,69	0,00		0,00	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	126,00	36,96	0,00	1.921,92	533,08	0,00	0,00
			52,00	36,96		1.921,92	533,08		
07.80.043	CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	0,00	15,00	0,00	727,64	201,82	0,00	0,00
			0,00	15,00		727,64	201,82		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,01	0,00		0,00	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,63	0,00		0,00	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,55	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,25	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,61	0,00		0,00	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,40	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,11	0,00		0,00	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			284,11	0,00		0,00	0,00		
08.04.051	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES	UN	0,00	1,00	0,00	221,82	61,52	0,00	0,00
			0,00	1,00		221,82	61,52		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,84	0,00		0,00	0,00		
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.224,68	0,00		0,00	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			361,47	0,00		0,00	0,00		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,11	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121,15	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.181,43	0,00		0,00	0,00		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,89	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,76	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
08.09.064	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	0,00		0,00	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,58	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66,18	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,91	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,79	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			397,20	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208,64	0,00		0,00	0,00		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			669,55	0,00		0,00	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			463,40	0,00		0,00	0,00		
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298,05	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.415,51	0,00		0,00	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			718,46	0,00		0,00	0,00		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	8,00	6,00	0,00	2.400,00	665,68	0,00	0,00
			400,00	6,00		2.400,00	665,68		
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380,00	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,00	0,00		0,00	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,16	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,93	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00	11,00	0,00	54,45	15,10	0,00	0,00
			0,00	11,00		54,45	15,10		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,46	0,00		0,00	0,00		
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,19	0,00		0,00	0,00		
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00	8,00	0,00	1.071,36	297,16	0,00	0,00
			133,92	8,00		1.071,36	297,16		
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,14	0,00		0,00	0,00		
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	8,00	2,00	0,00	234,12	64,93	0,00	0,00
			117,06	2,00		234,12	64,93		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	0,00		0,00	0,00		
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	0,00	444,00	0,00	1.167,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	444,00		1.167,72	0,00		
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00	208,00	0,00	4.270,24	1.184,43	0,00	0,00
			0,00	208,00		4.270,24	1.184,43		
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,83	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	425,00	607,40	0,00	18.829,40	3.723,10	0,00	0,00
			31,00	607,40		18.829,40	3.723,10		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	36,00	2,00	0,00	145,16	40,26	0,00	0,00
			72,58	2,00		145,16	40,26		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00	1,00	0,00	78,28	21,71	0,00	0,00
			0,00	1,00		78,28	21,71		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00	8,00	0,00	173,44	48,10	0,00	0,00
			21,68	8,00		173,44	48,10		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,83	0,00		0,00	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.119,35	0,00		0,00	0,00		
09.05.097	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854,29	0,00		0,00	0,00		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,46	0,00		0,00	0,00		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,91	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	4.487,60	0,00	12.026,76	3.335,84	0,00	0,00
			0,00	4.487,60		12.026,76	3.335,84		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00	416,00	0,00	2.258,88	626,54	0,00	0,00
			5,43	416,00		2.258,88	626,54		
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,80	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.025	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	680,00 4,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	26,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 197,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00 350,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	6,00 127,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00 184,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	6,00 97,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	6,00 191,51	18,00 18,00	0,00	3.447,18 3.447,18	956,13 956,13	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	7.455,50 7.455,50	2.067,92 2.067,92	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	260,00 140,00	304,00 304,00	0,00	42.560,00 42.560,00	4.543,28 4.543,28	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	38,00 57,84	8,00 8,00	0,00	462,72 462,72	128,34 128,34	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.077	IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W.	UN	0,00 0,00	23,00 23,00	0,00	11.395,58 11.395,58	3.160,75 3.160,75	0,00 0,00	0,00 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 930,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	0,00 0,00	547,83 547,83	0,00	15.273,49 15.273,49	4.236,38 4.236,38	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPAS DE CONCRETO	UN	33,00 150,00	44,00 44,00	0,00	6.600,00 6.600,00	1.830,63 1.830,63	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	33,00 50,00	44,00 44,00	0,00	2.200,00 2.200,00	610,21 610,21	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPOORTE.DE FIXAÇÃO.	M	796,00 27,00	1.027,40 1.027,40	0,00	27.739,80 27.739,80	7.694,14 7.694,14	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00 5,43	540,40 540,40	0,00	2.934,37 2.934,37	551,23 551,23	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	12,00 43,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.580,00 0,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00 0,00	75,00 75,00	0,00	1.049,25 1.049,25	291,02 291,02	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	266,00 5,00	258,00 258,00	0,00	1.290,00 1.290,00	98,46 98,46	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00	50,00	0,00	598,00	165,86	0,00	0,00
			0,00	50,00		598,00	165,86		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00	81,00	0,00	1.096,74	304,20	0,00	0,00
			0,00	81,00		1.096,74	304,20		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	258,00	0,00	970,08	269,06	0,00	0,00
			0,00	258,00		970,08	269,06		
09.85.019	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,00	0,00		0,00	0,00		
09.85.043	LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,50	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	321,00	0,00	9.630,00	2.254,99	0,00	0,00
			30,00	321,00		9.630,00	2.254,99		
09.86.026	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2	UN	0,00	164,00	0,00	2.031,96	563,60	0,00	0,00
			0,00	164,00		2.031,96	563,60		
09.86.027	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2	UN	0,00	160,00	0,00	3.720,00	1.031,80	0,00	0,00
			0,00	160,00		3.720,00	1.031,80		
11.02.028	IMPERMEABILIZACAO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 DEMAOS	M2	0,00	399,60	0,00	10.961,02	3.040,23	0,00	0,00
			0,00	399,60		10.961,02	3.040,23		
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00	67,00	0,00	3.274,29	0,00	0,00	0,00
			0,00	67,00		3.274,29	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	107,00	47,87	0,00	284,82	0,00	0,00	0,00
			5,95	47,87		284,82	0,00		
12.02.005	EMBOCO	M2	107,00	47,87	0,00	1.196,75	0,00	0,00	0,00
			25,00	47,87		1.196,75	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	148,00	47,87	0,00	2.728,59	0,00	0,00	0,00
			57,00	47,87		2.728,59	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,95	0,00		0,00	0,00		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,52	0,00		0,00	0,00		
12.04.022	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM	M2	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155,47	0,00		0,00	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	176,40	47,87	0,00	718,05	0,00	0,00	0,00
			15,00	47,87		718,05	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	719,82	0,00	15.425,73	4.278,60	0,00	0,00
			0,00	719,82		15.425,73	4.278,60		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.010	QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR	M2	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,43	0,00		0,00	0,00		
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,64	0,00		0,00	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	288,00	0,00	3.697,91	798,10	0,00	0,00
			0,00	288,00		3.697,91	798,10		
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	25,76	1,80	0,00	225,00	62,40	0,00	0,00
			125,00	1,80		225,00	62,40		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	330,00	257,54	0,00	5.665,88	1.571,53	0,00	0,00
			22,00	257,54		5.665,88	1.571,53		
13.50.003	DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00	76,16	0,00	1.287,10	356,99	0,00	0,00
			0,00	76,16		1.287,10	356,99		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,16	0,00		0,00	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,71	0,00		0,00	0,00		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	417,48	0,00	6.775,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	417,48		6.775,70	0,00		
13.80.022	COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO	M2	0,00	597,00	0,00	7.205,79	1.998,65	0,00	0,00
			0,00	597,00		7.205,79	1.998,65		
13.80.068	PISO PORCELANATO ESMALTADO	M2	0,00	751,18	0,00	73.007,17	8.995,68	0,00	0,00
			0,00	751,18		73.007,17	8.995,68		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,56	0,00		0,00	0,00		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,33	0,00		0,00	0,00		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,09	0,00		0,00	0,00		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,91	0,00		0,00	0,00		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,14	0,00		0,00	0,00		
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,55	0,00		0,00	0,00		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	9.830,00	4.971,31	0,00	59.655,72	4.633,22	0,00	0,00
			12,00	4.971,31		59.655,72	4.633,22		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.172,18	0,00		0,00	0,00		
15.80.010	PINTURA EM AZULEJO	M2	2.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00	2.028,84	0,00	31.609,31	8.767,40	0,00	0,00
			0,00	2.028,84		31.609,31	8.767,40		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	310,00	2.206,66	0,00	37.513,22	10.404,97	0,00	0,00
			17,00	2.206,66		37.513,22	10.404,97		

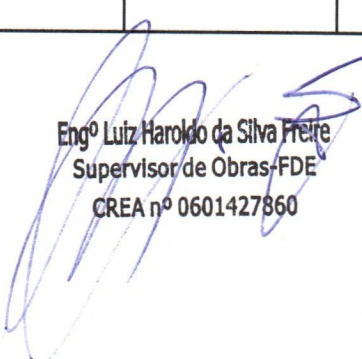
Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00	313,99	0,00	4.207,46	1.167,01	0,00	0,00
			0,00	313,99		4.207,46	1.167,01		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,57	0,00		0,00	0,00		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00	614,92	0,00	12.734,98	3.532,27	0,00	0,00
			0,00	614,92		12.734,98	3.532,27		
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			576,65	0,00		0,00	0,00		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	37,38	0,00	209,32	58,05	0,00	0,00
			0,00	37,38		209,32	58,05		
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	8.200,00	534,00	0,00	427,20	118,49	0,00	0,00
			0,80	534,00		427,20	118,49		
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	60,00	23,00	3,00	6.900,00	1.913,83	900,00	249,63
			300,00	20,00		6.000,00	1.664,20		
16.03.465	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	UN	43,00	48,00	18,00	52.800,00	14.645,03	19.800,00	5.491,89
			1.100,00	30,00		33.000,00	9.153,14		
16.03.482	FRUTÍFERA UVAIA - DAP3	UN	2,00	18,00	0,00	4.256,10	1.180,50	0,00	0,00
			236,45	18,00		4.256,10	1.180,50		
16.03.483	PALMEIRA GUARIROBA - DAP3	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,60	0,00		0,00	0,00		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,29	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00	93,00	0,00	10.069,10	2.792,84	0,00	0,00
			0,00	93,00		10.069,10	2.792,84		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00	93,00	0,00	8.029,62	2.227,16	0,00	0,00
			0,00	93,00		8.029,62	2.227,16		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	40,50	145,00	0,00	2.820,25	377,62	0,00	0,00
			19,45	145,00		2.820,25	377,62		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,39	0,00		0,00	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	10,00	6,75	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
			250,00	6,75		1.687,50	0,00		
16.06.087	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,02	0,00		0,00	0,00		
16.06.088	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,16	0,00		0,00	0,00		
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,04	0,00		0,00	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.253,53	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-001	Valor	652.021,29
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	10/09/2021	Redução	33.6900%
Nro. Medição	9	Prédio	22101 - EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS		
PI	2018/00967	Situação	Aprovada	Orc. FDE	983.483,16
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	5312.28
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF WOLNY CARVALHO RAMOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00	0,00		
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	74,00	267,77	0,00	18.743,90	5.198,95	0,00	0,00
			70,00	267,77		18.743,90	5.198,95		
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	77,26	0,00	1.937,68	537,45	0,00	0,00
			0,00	77,26		1.937,68	537,45		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,17	0,00		0,00	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,32	0,00		0,00	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00	37,38	0,00	1.125,51	312,18	0,00	0,00
			0,00	37,38		1.125,51	312,18		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	20,00	0,00	8.336,40	1.734,17	0,00	0,00
			0,00	20,00		8.336,40	1.734,17		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
631.209,78	651.909,78	20.700,00	631.209,78	651.909,78	20.700,00	
			135.847,38	141.588,90	5.741,52	
			767.057,16	793.498,68	VALOR A LIBERAR 26.441,52	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860
